

Items	Pending	In-progress	Completed	Total
Pending	Pending	In-progress	In-progress	Completed
Pending	Pending	In-progress	In-progress	Completed
Pending		In-progress		Completed
		In-progress		Completed

Manual de Ejecución: Proyecto Final en 14 Días

>_ Organización Ágil con Kanban para Equipos de Desarrollo.


```
1 // Process incoming request
2 async function processTask(taskId, data) {
3   const task = await db.get(taskId);
4   if (task.status === "pending") {
5     const result = await execute(data);
6     // ... (omitted) ... result });
7   }
8   return { status: "already processed" };
9 }
10 }
```

**50% Escribir
Código**



**50% Gestionar
y Coordinar**

Entregar un trabajo funcional en 2 semanas requiere mucho más que programación. Exige priorizar el trabajo, comunicar avances, resolver bloqueos y cumplir plazos.

Scrum

Sprints de 1-4 semanas

Product Owner, Scrum Master fijos

Difícil a mitad de sprint

Velocidad

Estructura

Roles

Cambios

Métrica

Kanban

Flujo continuo, sin sprints

Flexible, sin roles obligatorios

Libre, entra día a día

Lead time: tiempo de TO DO a DONE

Para este curso, adoptamos **Kanban**. Cada persona **toma tareas según las termina**, sin la rigidez de sprints cerrados.



Profesor = Project Manager (PM)

- Define el alcance final.
- Audita avances clave.
- Destraba problemas de alto nivel.




La revisión del PM **desbloquea** el avance del Team.



Grupos = Dev Teams

- Equipos auto-organizados.
- Ejecutan las tareas diarias.
- Comunican bloqueos inmediatamente.

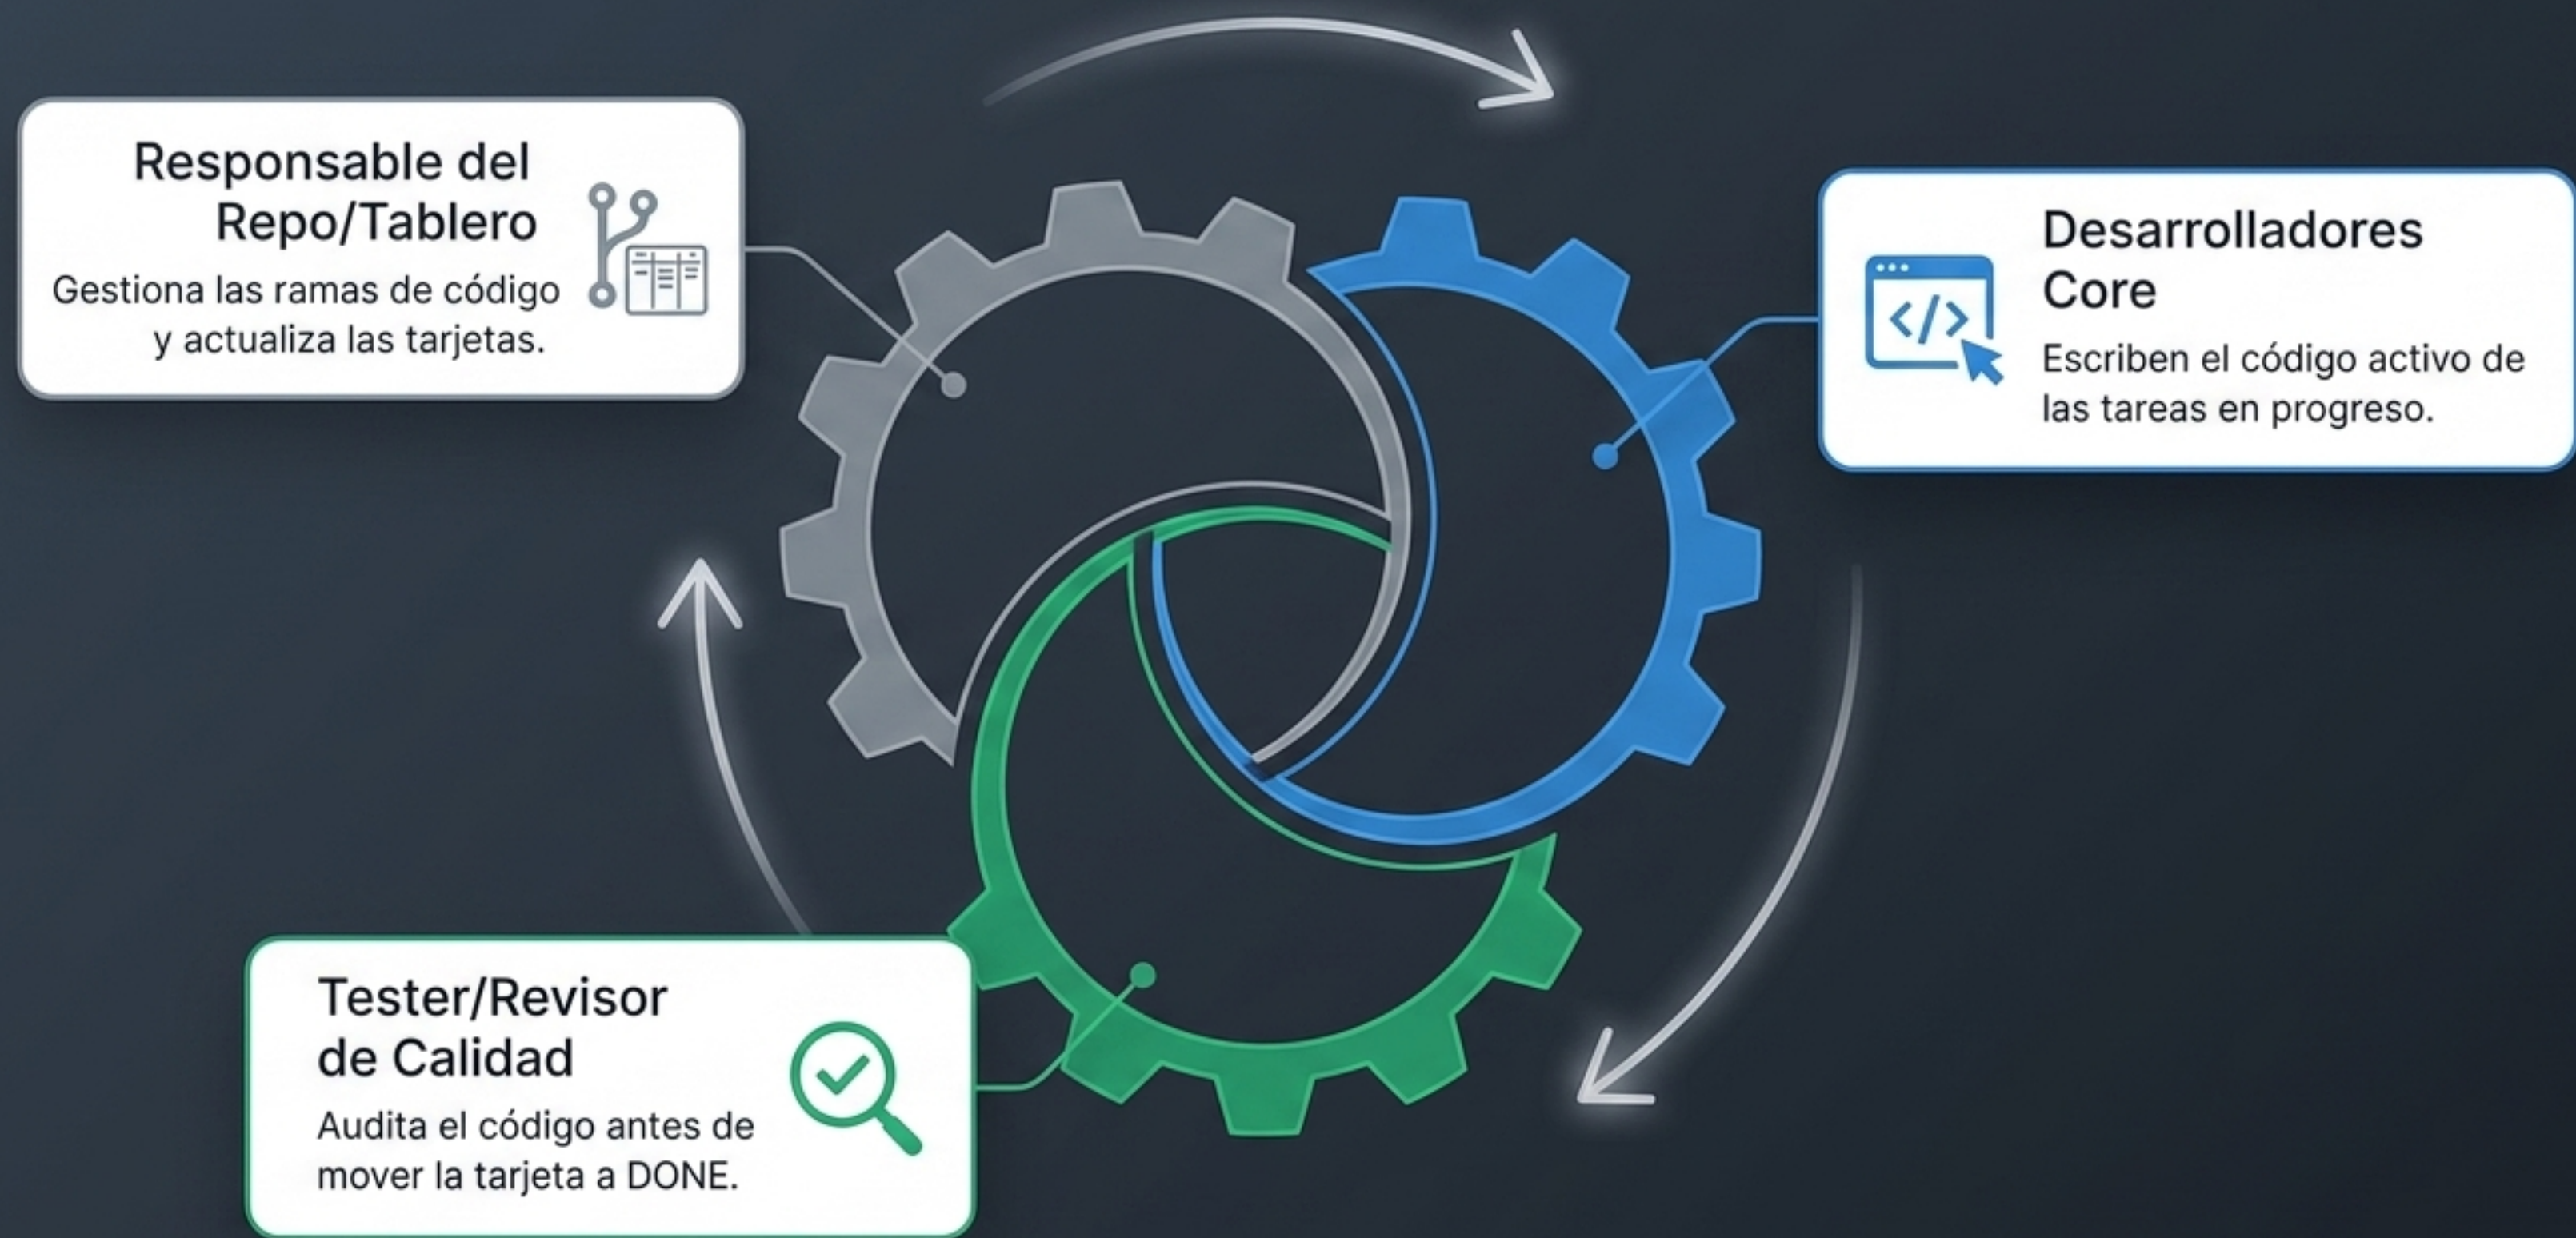

* En Kanban no hay roles fijos. Estos tres sombreros son obligatorios para el grupo, pero rotativos entre los integrantes.




Pizarra física con
post-its
(Solo referencia)



Apps externas
separadas del código
[Trello, Asana, Monday]
(Viven fuera del código)



Tablero integrado
en el repositorio
[GitHub Projects]
(El código y la gestión
habitan el mismo lugar)

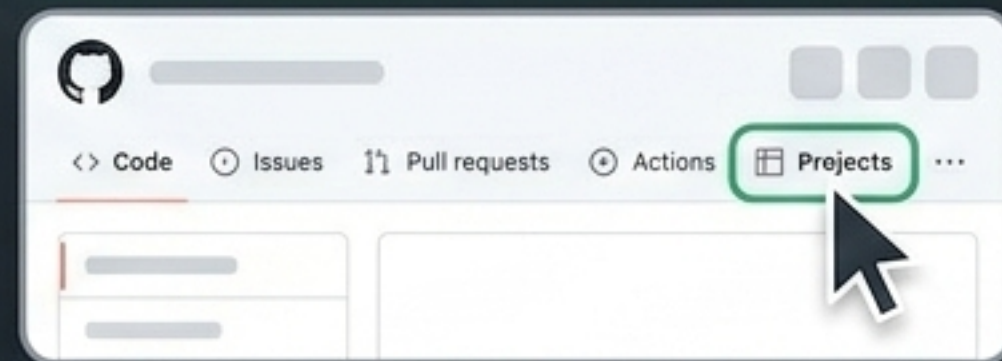

Flujo de trabajo de GitHub Projects

Flujo
Unidireccional
de Valor


TO DO

Contenedor para tareas pendientes o Backlog.



IN PROGRESS


Contenedor para tareas que se están realizando activamente en este momento.




DONE

Contenedor exclusivo para tareas completadas, probadas y funcionales.



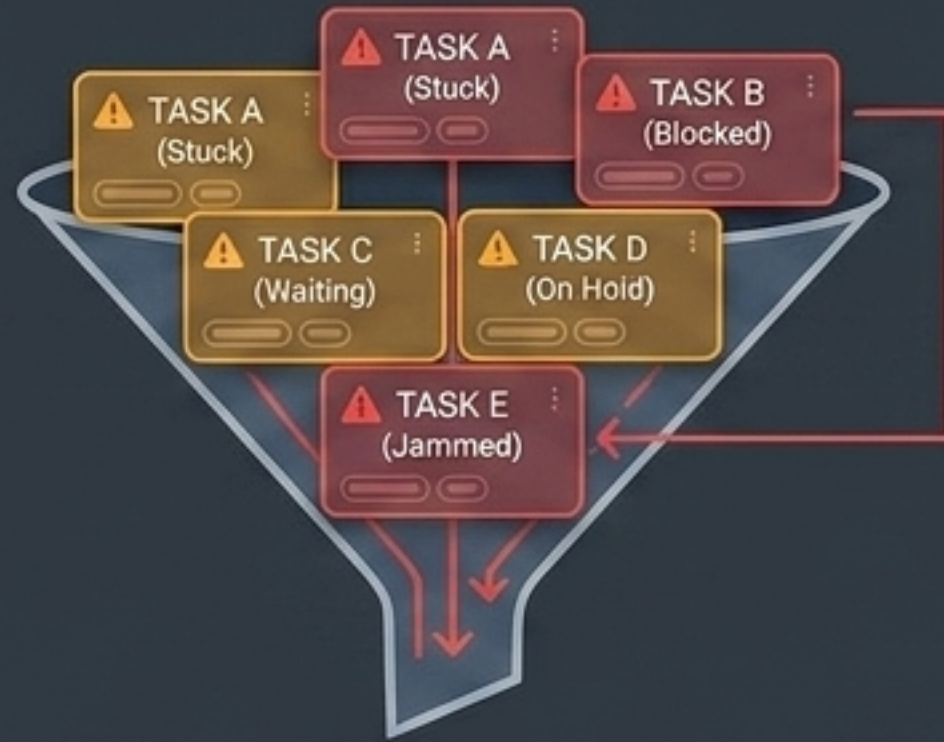

✗ Multitasking = Atasco total

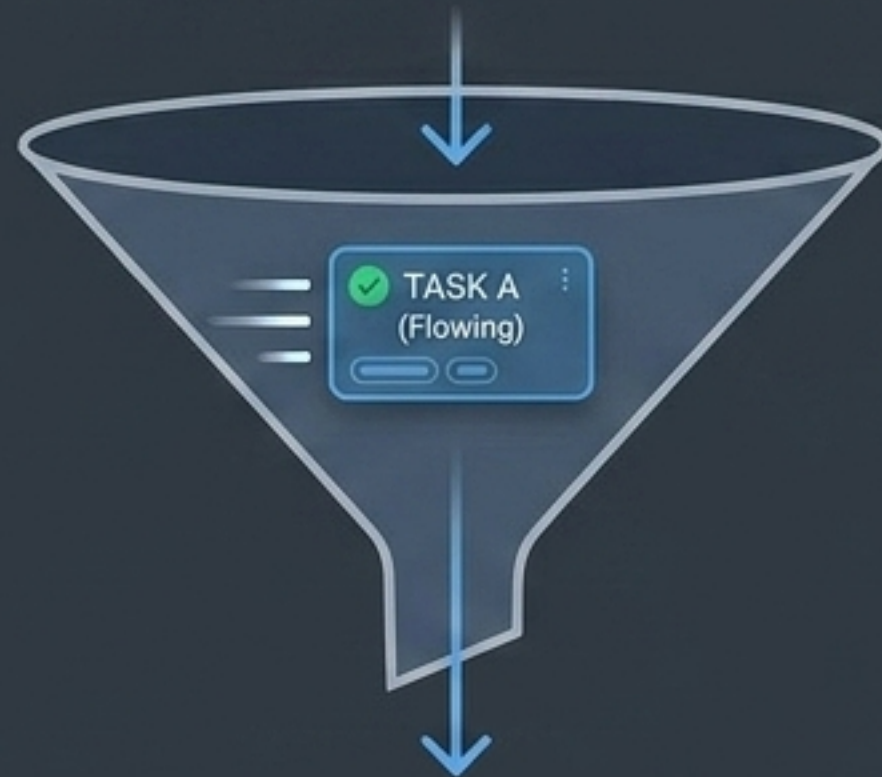


✓ Flujo Continuo


Regla de Oro #1: WIP Limit

- Nunca más de 1-2 tareas en "IN PROGRESS" al mismo tiempo por equipo.
- Empezar 5 cosas y no terminar ninguna es peor que empezar 1 y terminarla bien. Dejar de empezar, empezar a terminar.

Regla de los 2 Días (48h en IN PROGRESS)

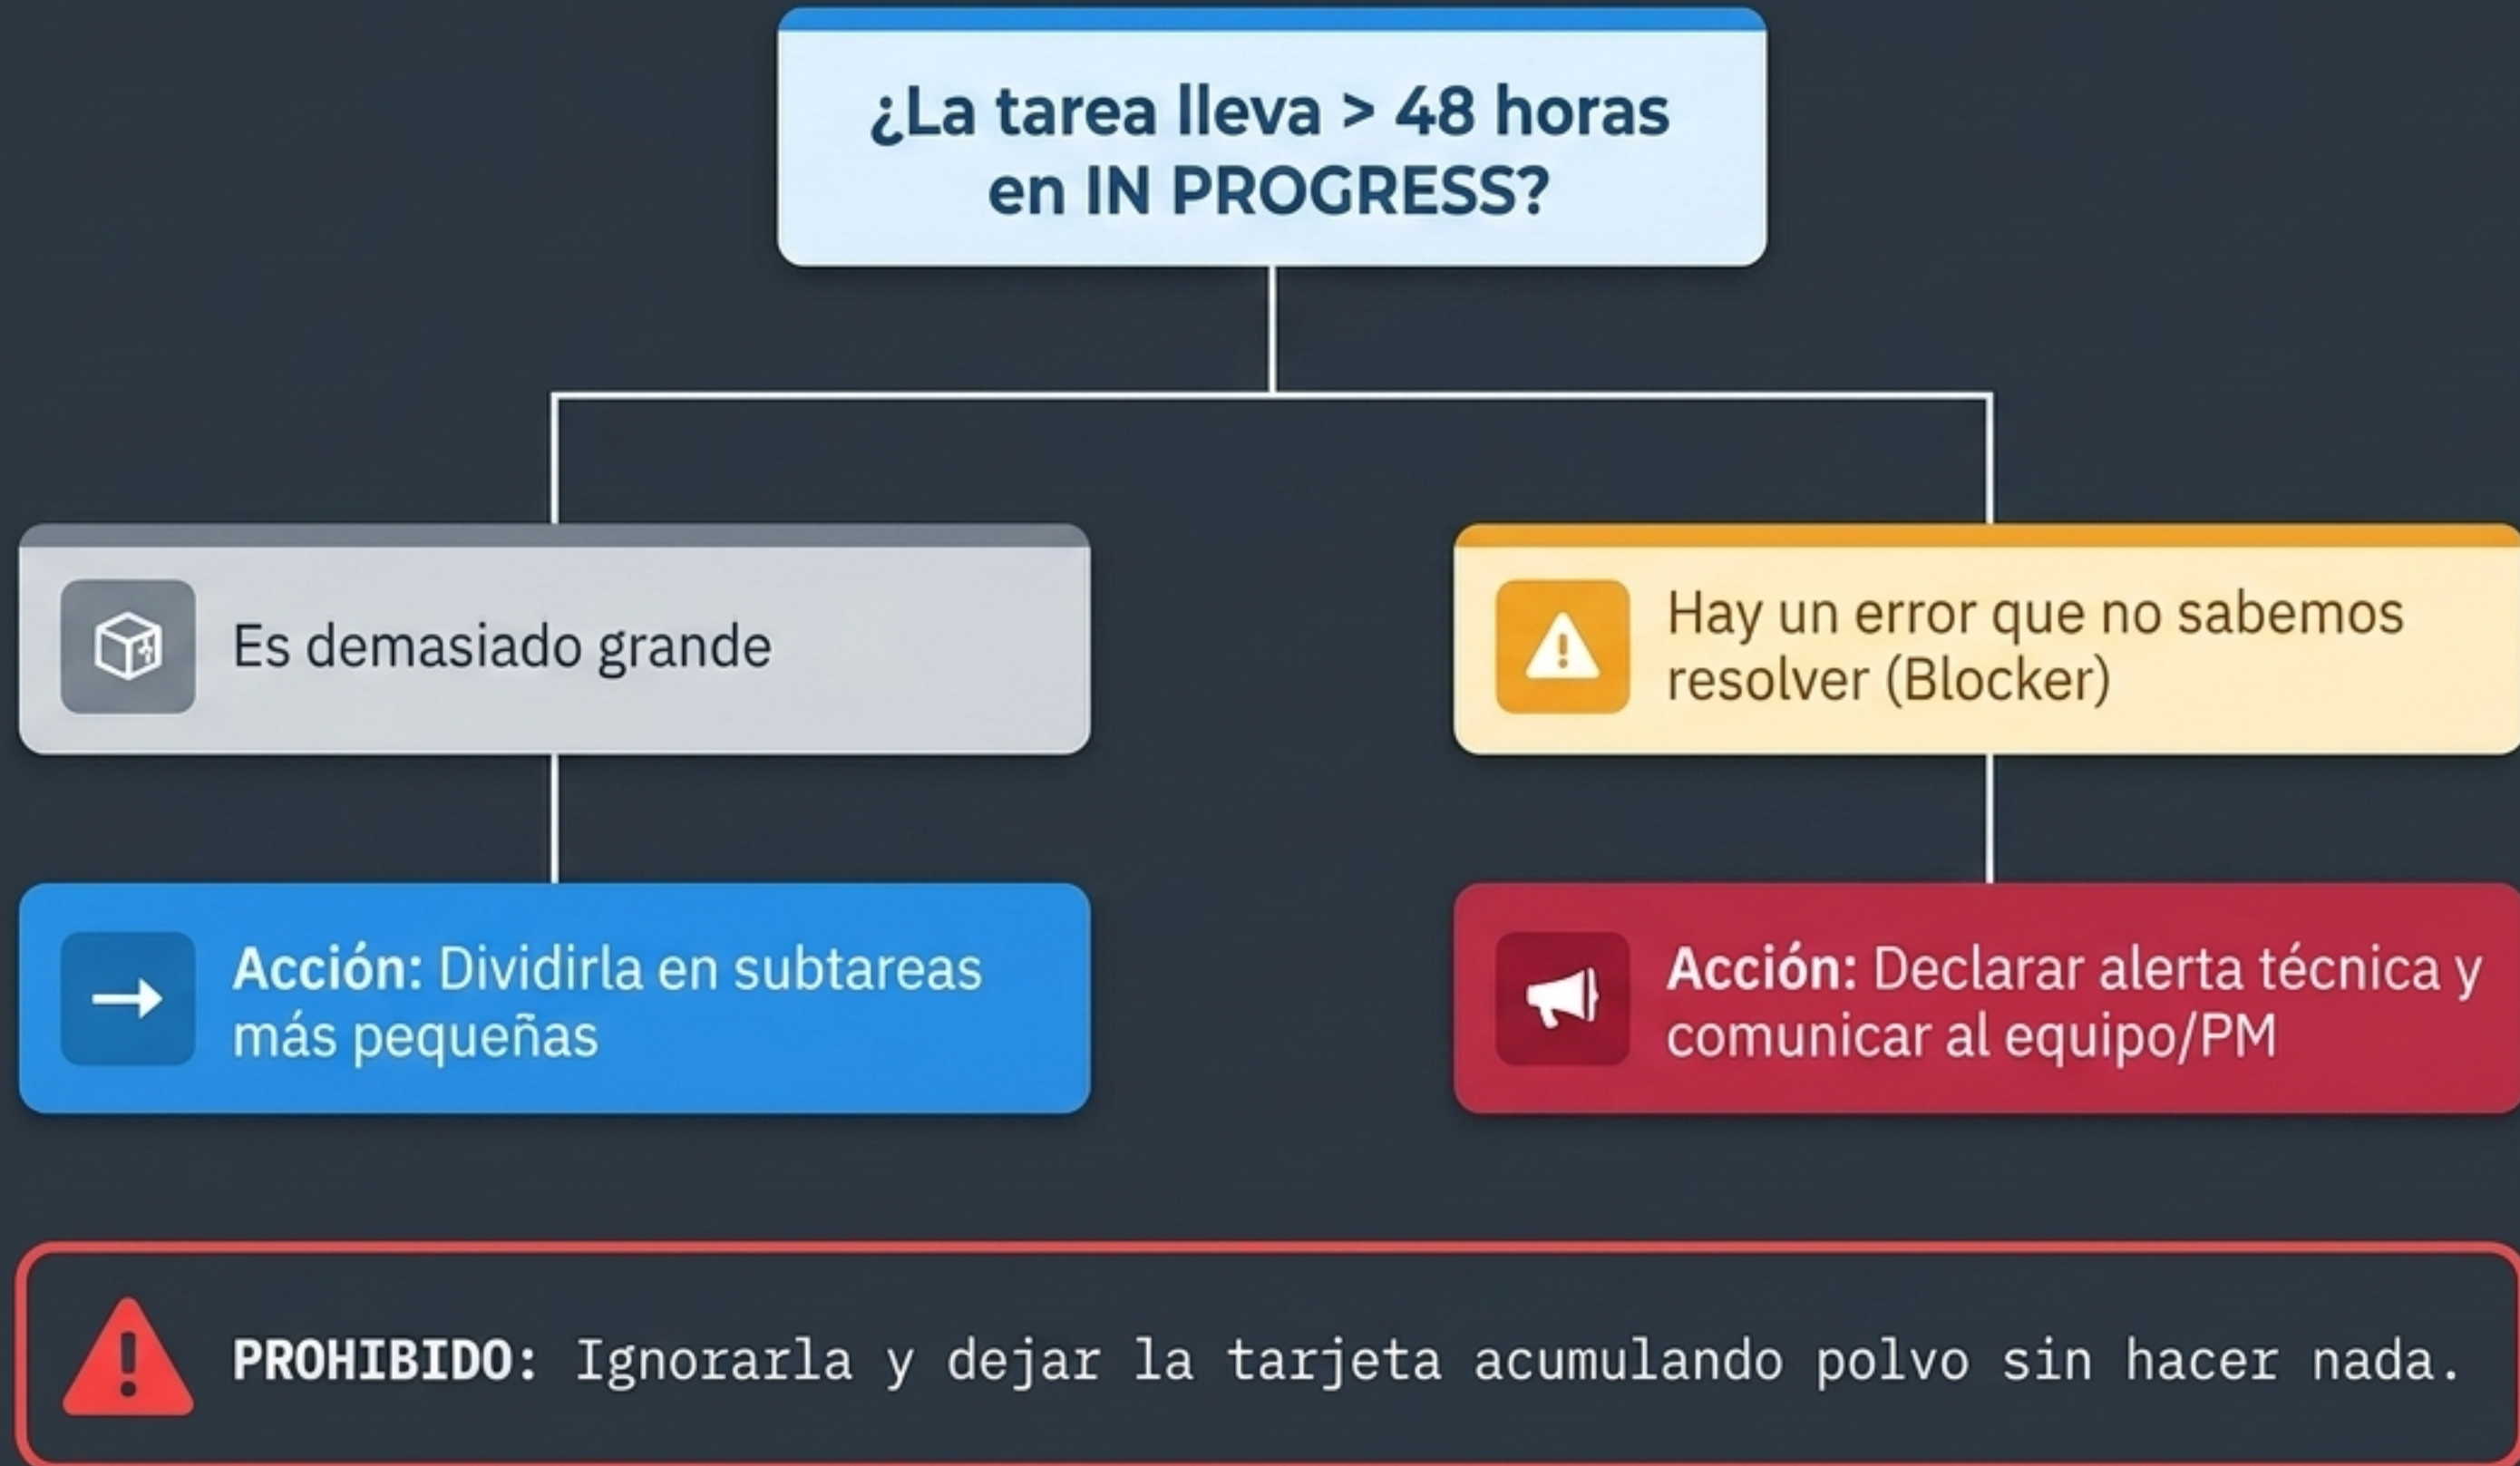

DÍAS 1-2

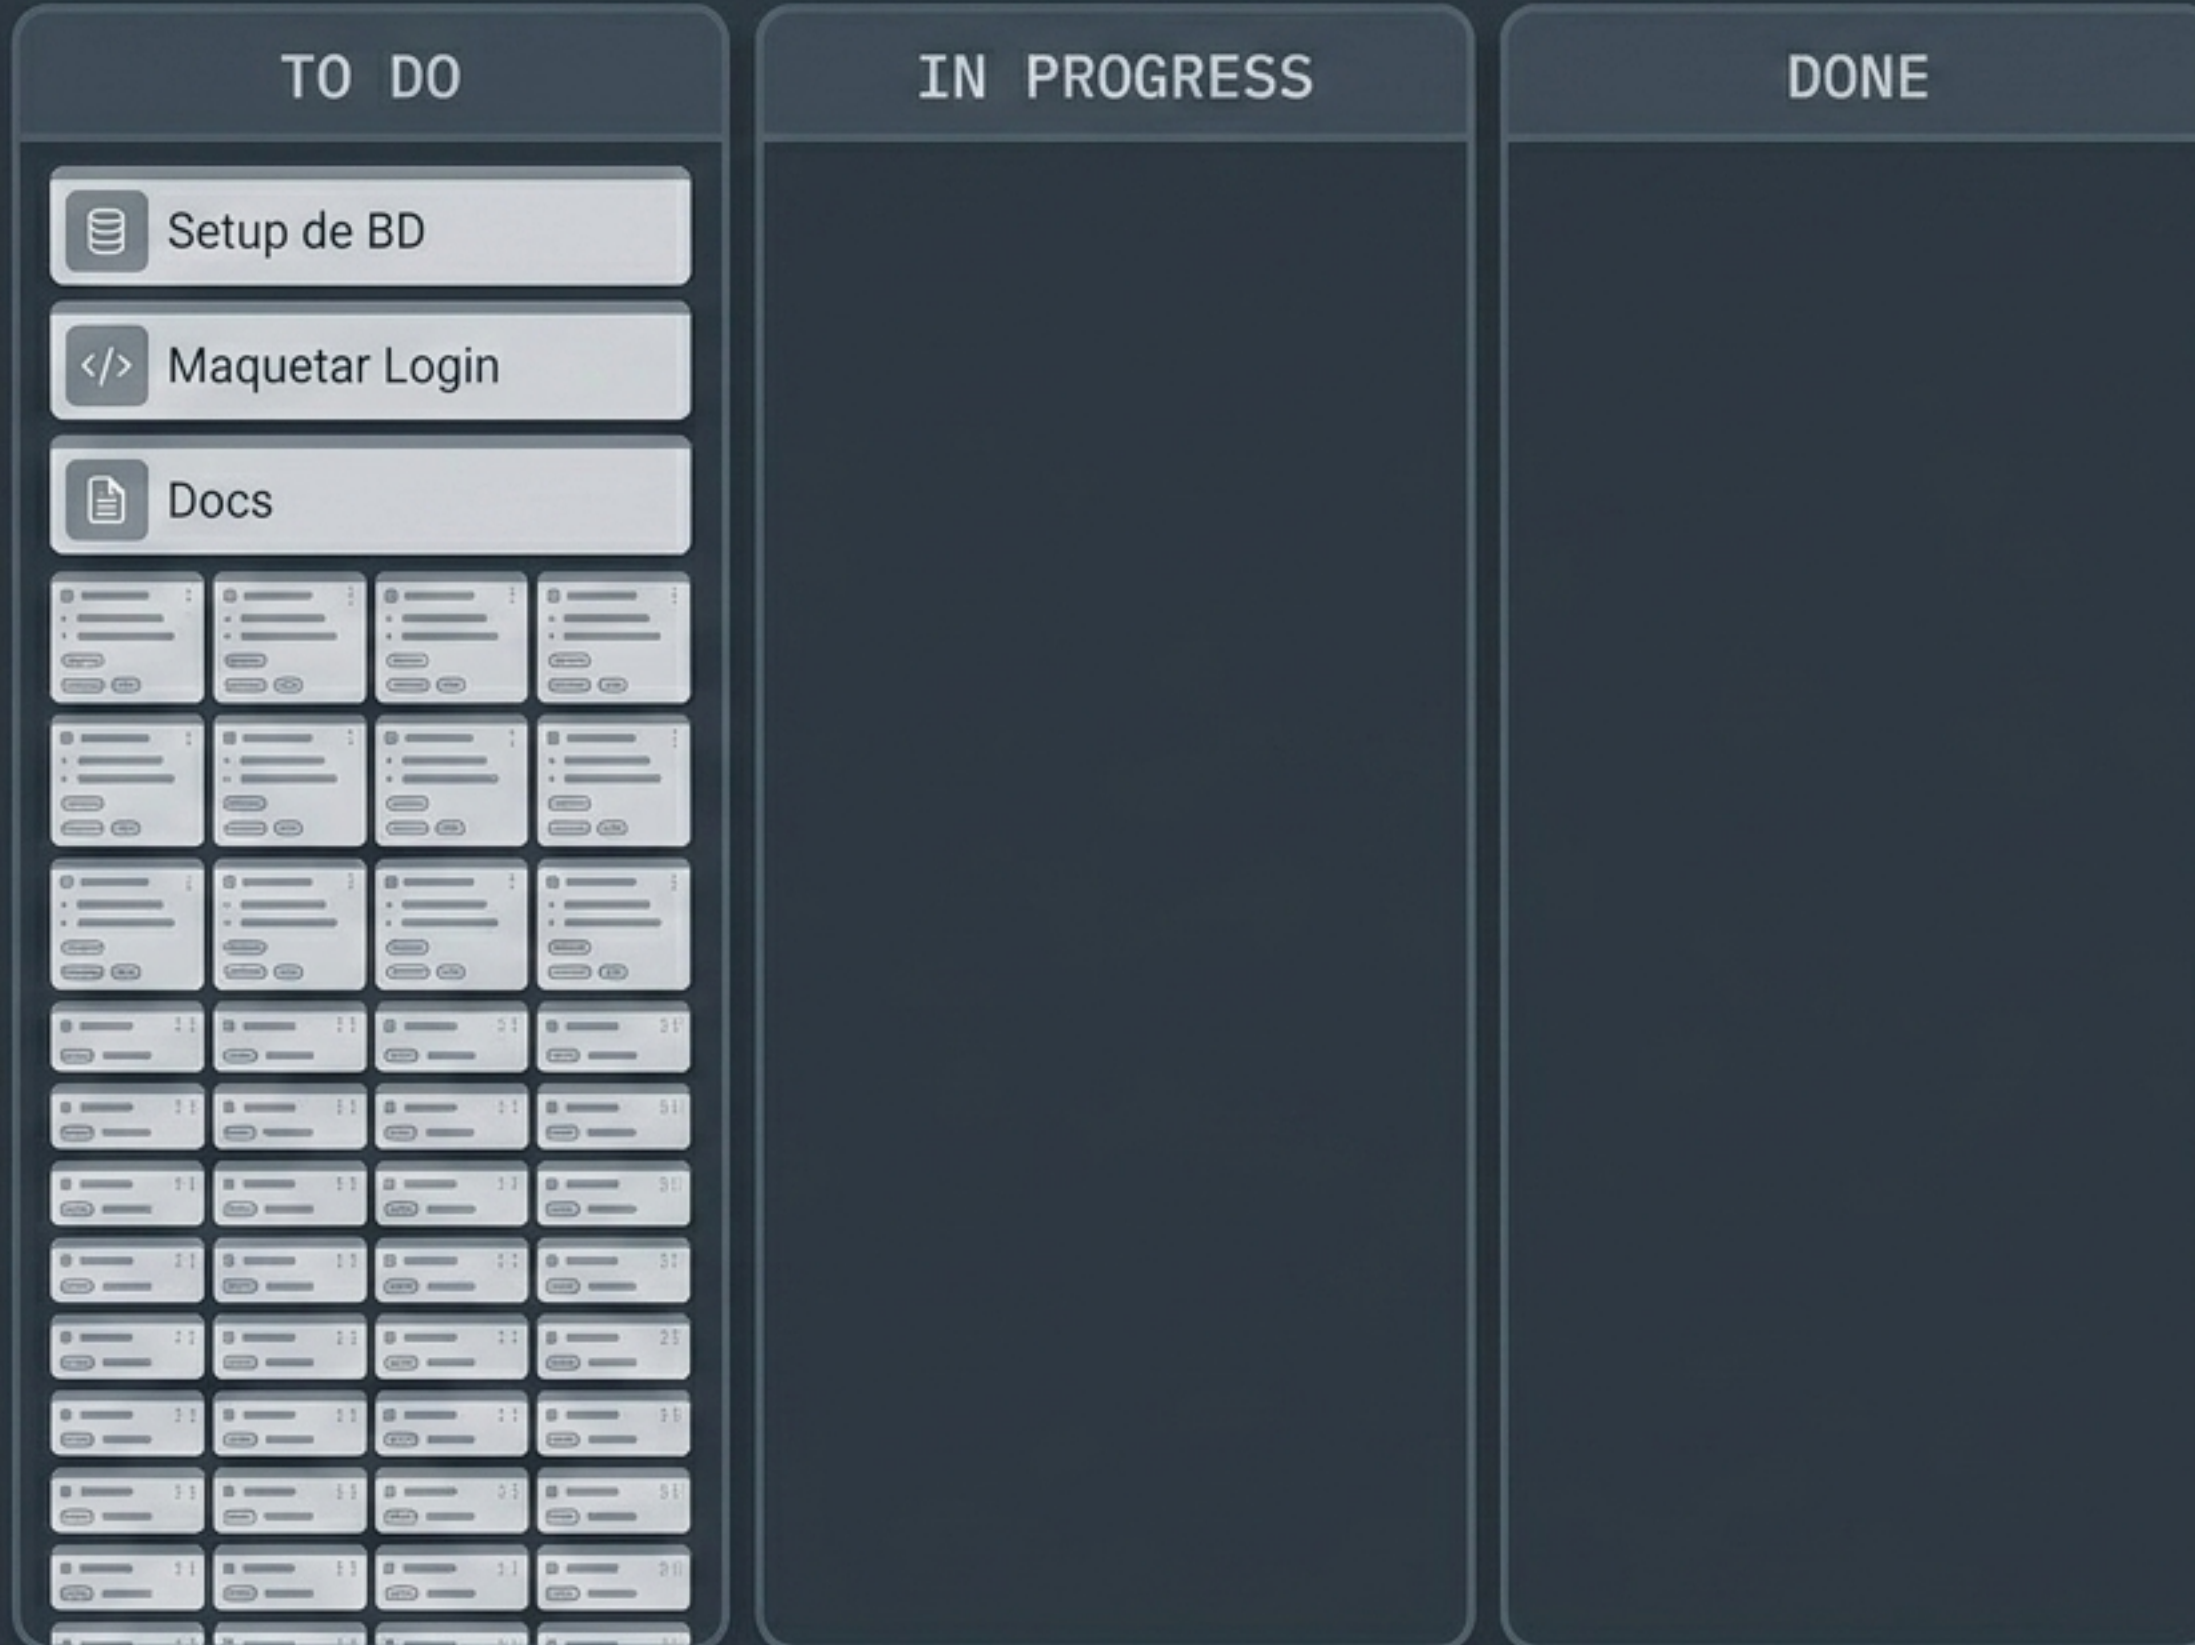


FASE DE KICK-OFF

El grupo desmenuza el proyecto entregado por el Profesor en tareas atómicas y manejables.

El Profesor (PM) audita y aprueba este Backlog inicial antes de que se escriba una sola línea de código.

DÍAS 3-6

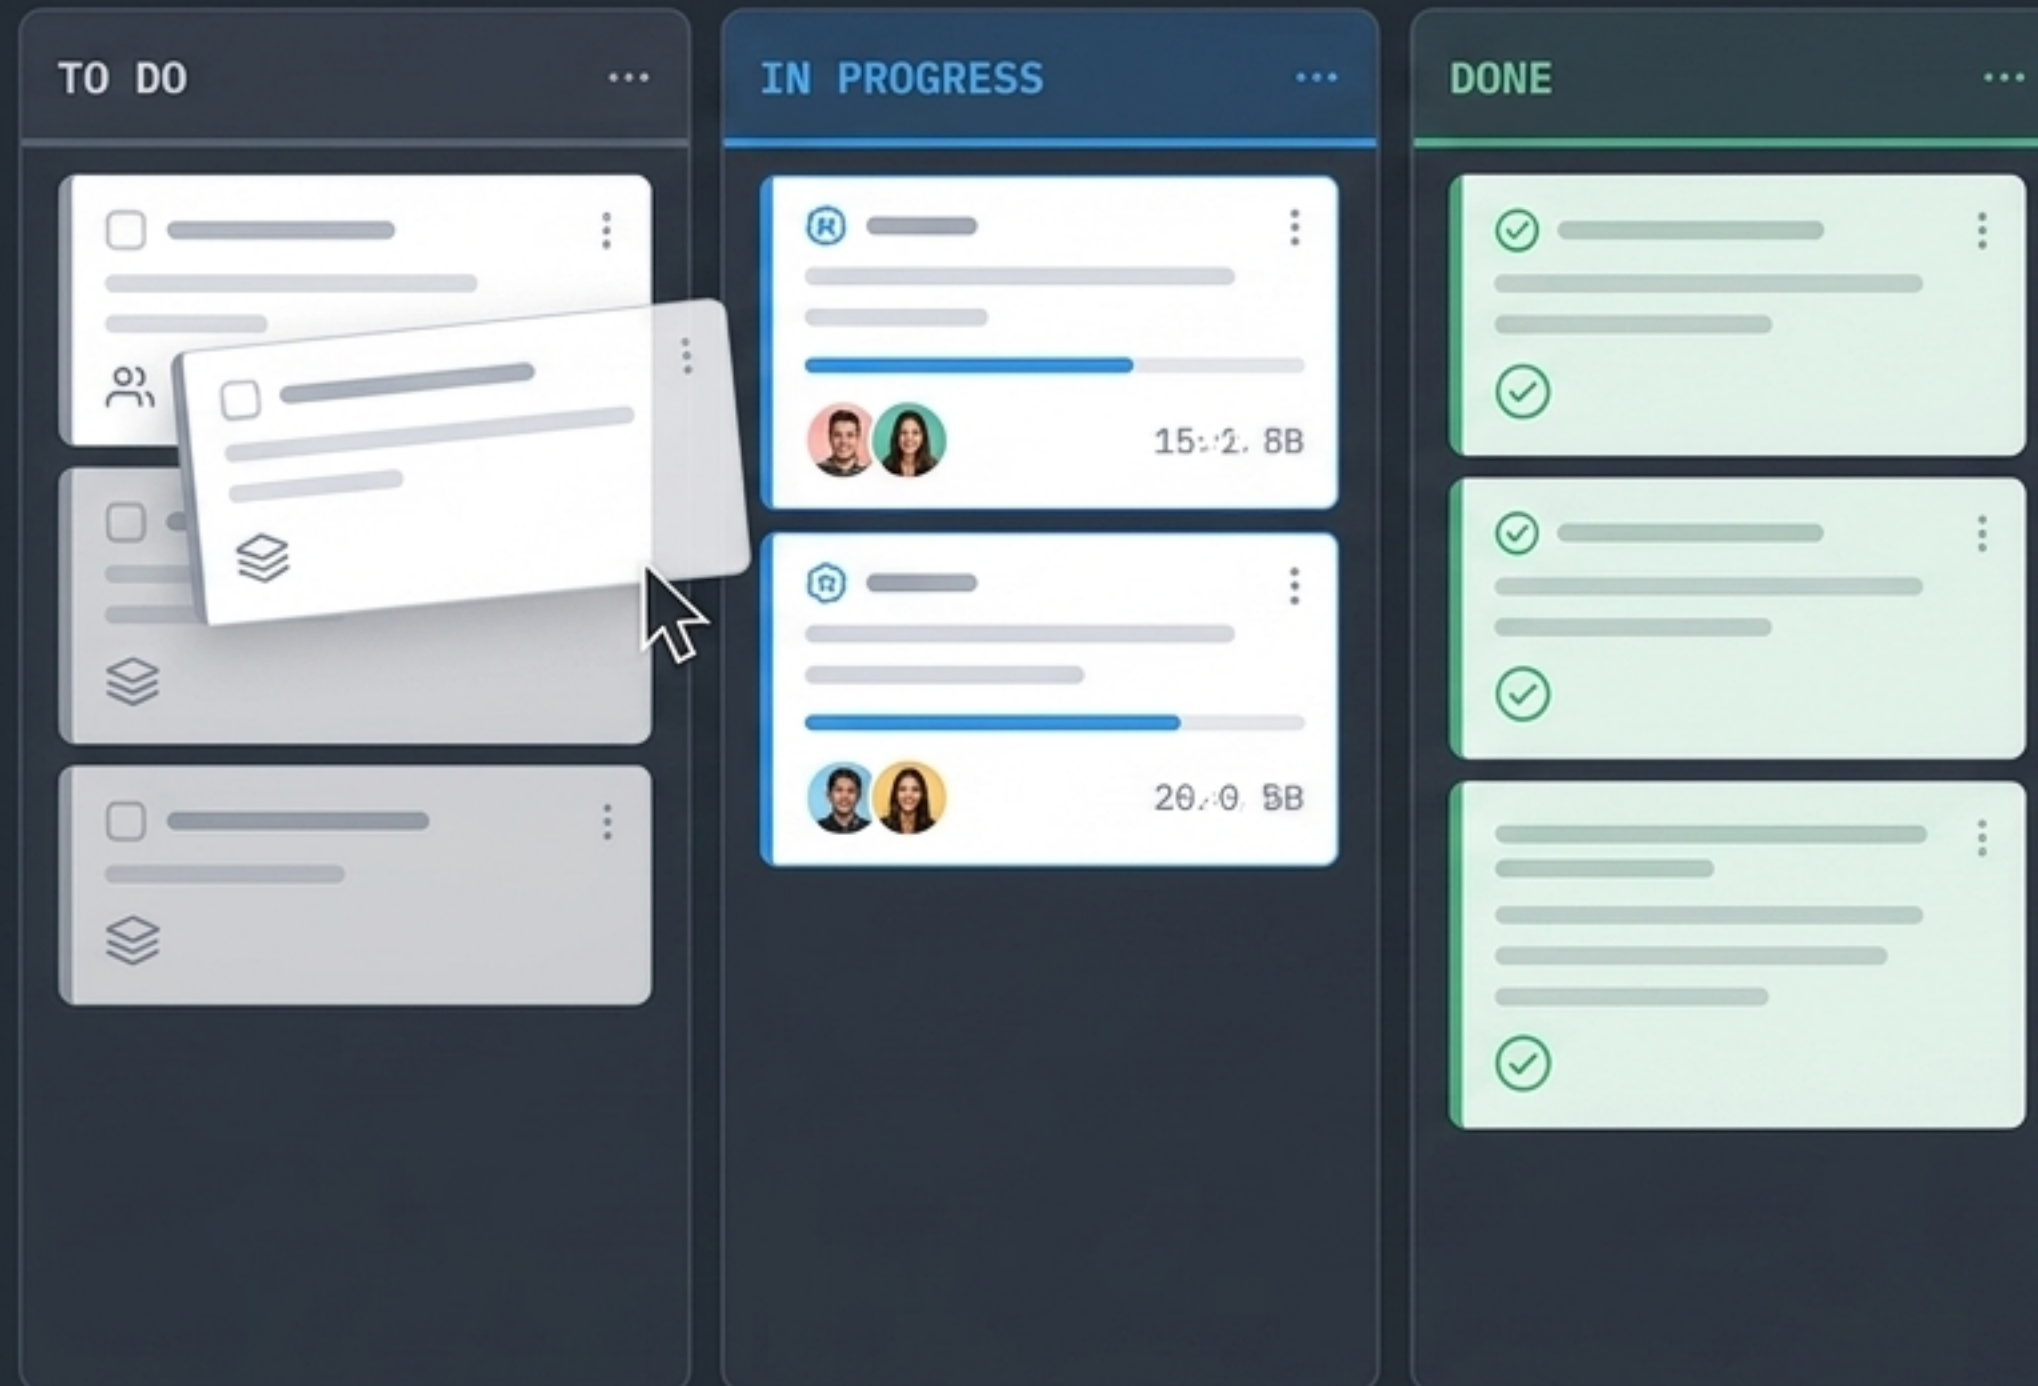

FLUJO CONTINUO

Cada miembro toma una tarea de la cima del **TO DO** solo cuando su capacidad se libera.

Se realizan reuniones diarias (**Dailies**) de exactamente 5 minutos exclusivamente para sincronizar el avance, no para programar en conjunto.

IN PROGRESS

BLOCKER

Conexión API Externa

📁 Proyecto APII: D..... 🔗 810 ⌚ Clear

👤 15 tenitas

15%



LA CRISIS


Llevan 48 horas atascados en el mismo error.

Se ejecuta la Regla de los 2 Días: El equipo detiene la ingesta de nuevas tareas.

No se oculta el problema; se escala inmediatamente al Profesor (PM) en su rol de gestor para destrabar el obstáculo arquitectónico.



DÍAS 9-11

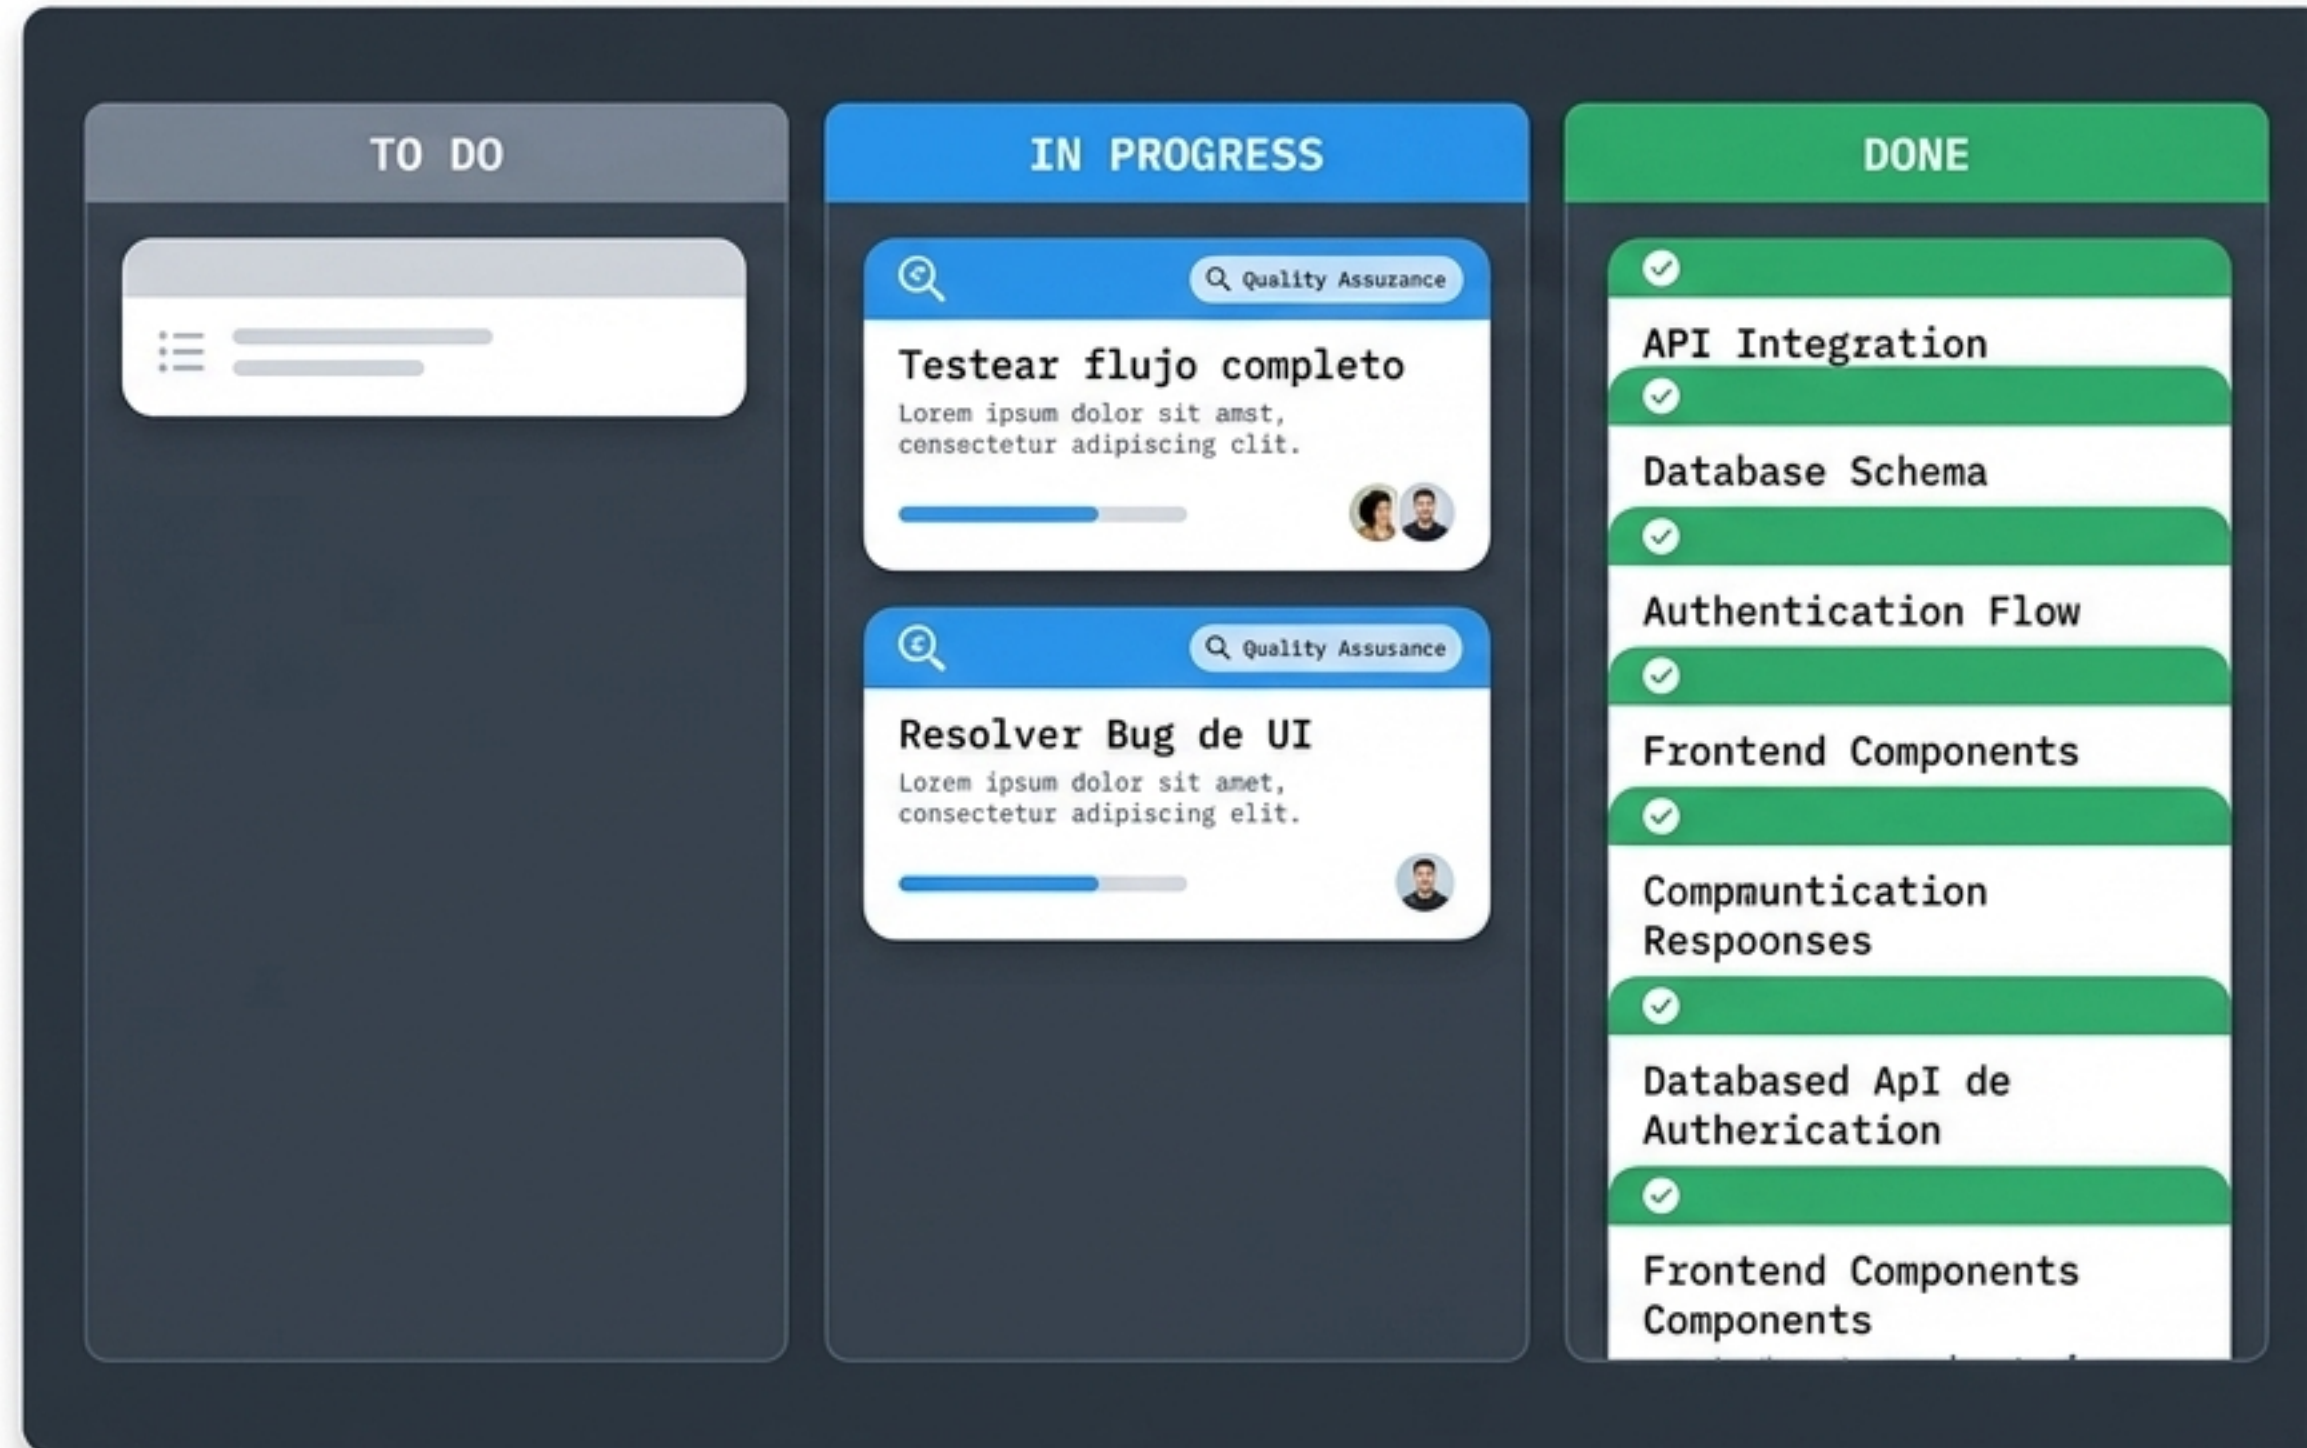


INTEGRACIÓN Y CALIDAD

Las piezas aisladas se ensamblan en un sistema.

El equipo asume el rol de Testers.

El Profesor revisa selectivamente el código que ya reside en la columna DONE para garantizar calidad continua.


DÍAS 12-14

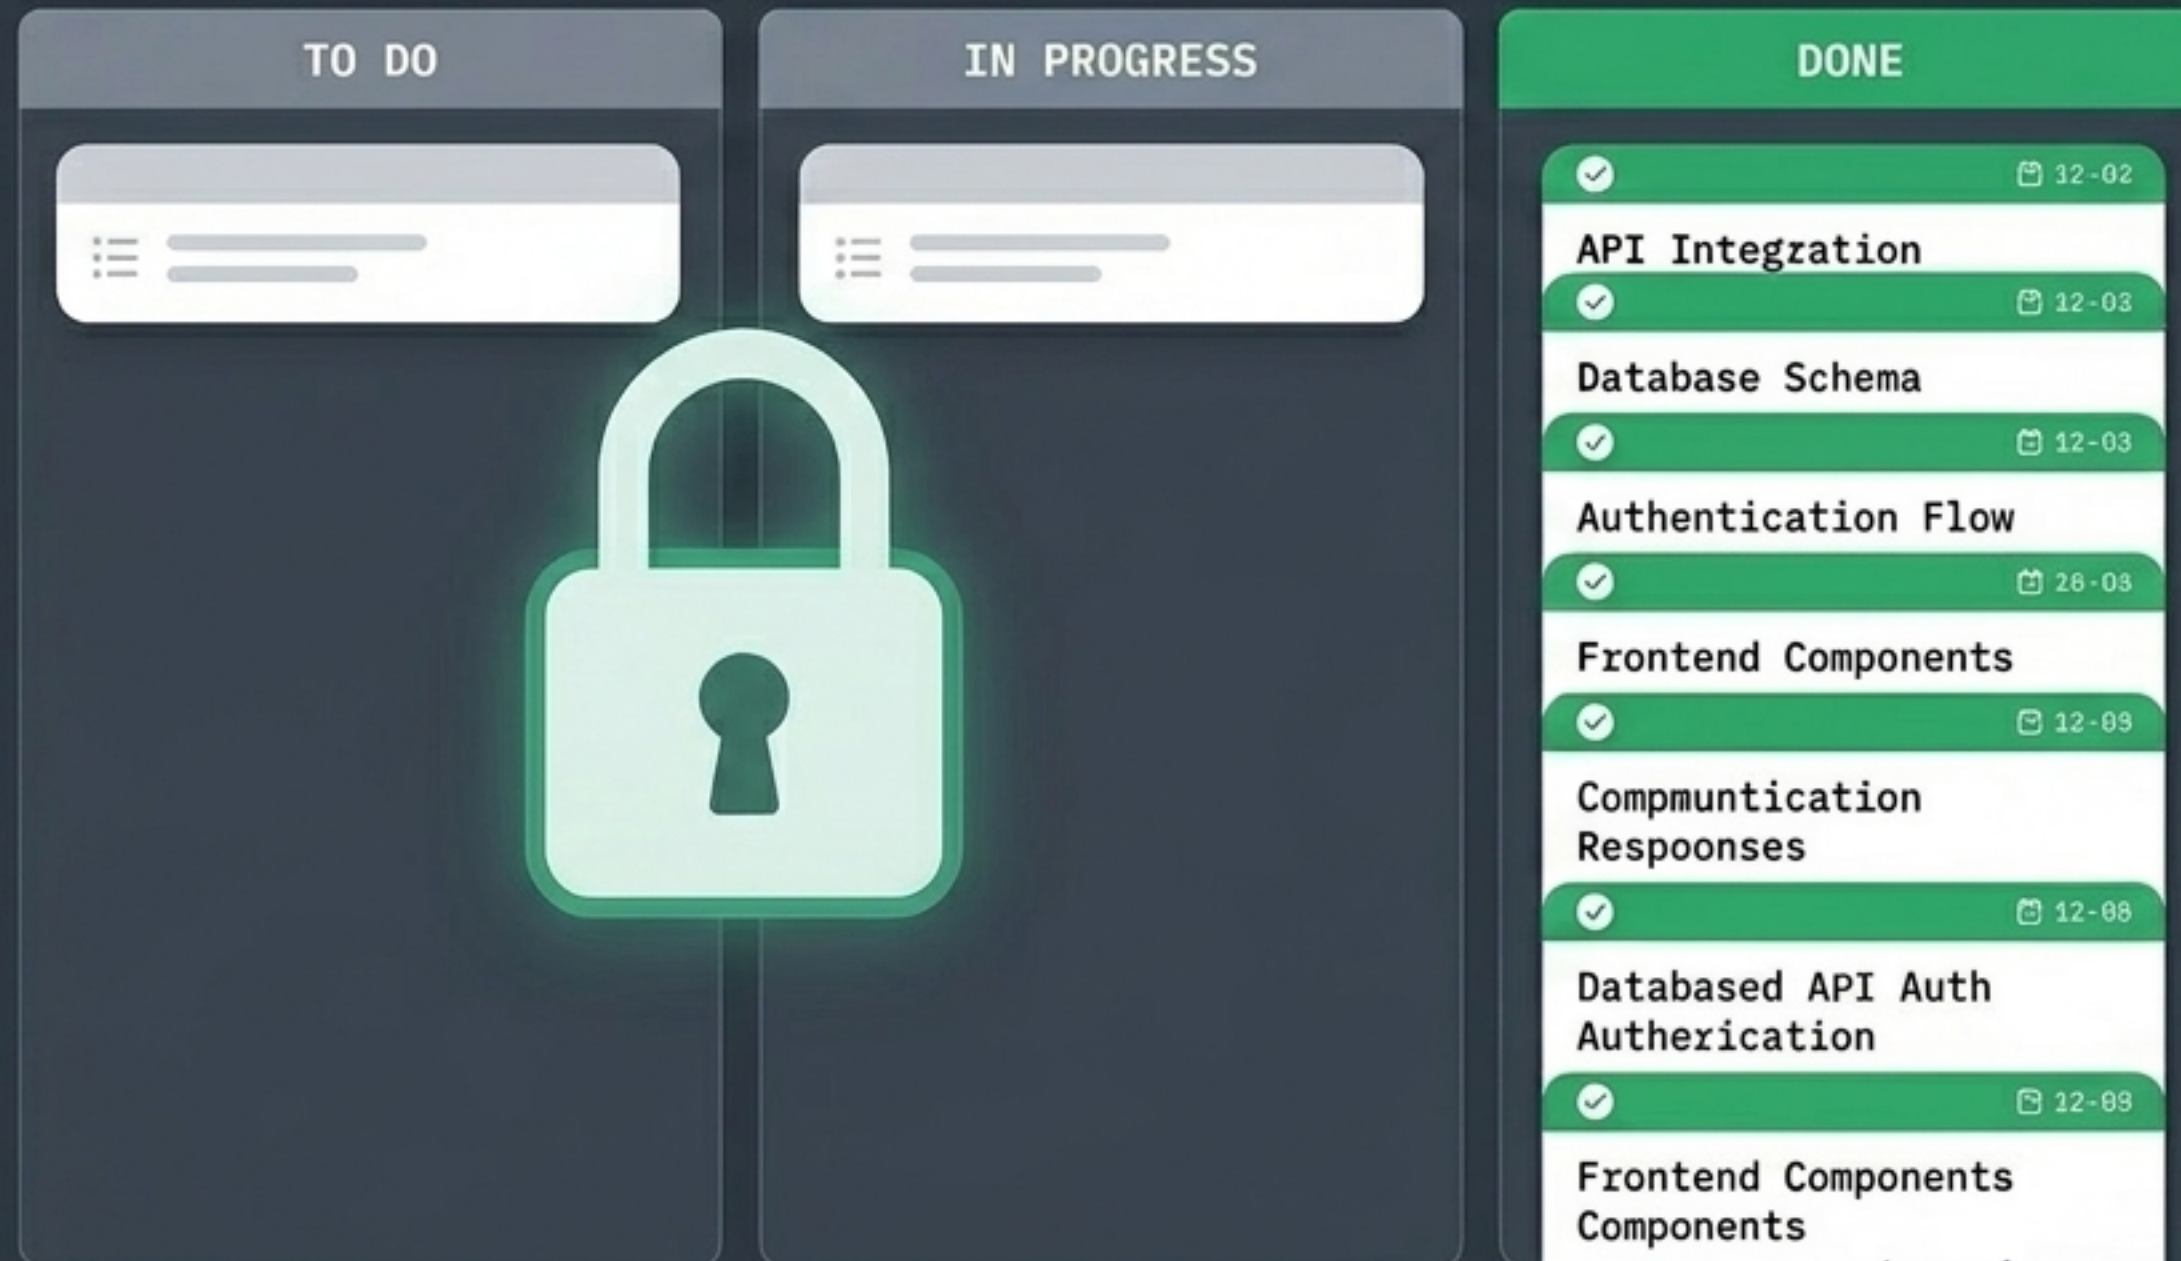

CONGELAMIENTO Y ENTREGA

Se declara Code Freeze: prohibido agregar nuevas funcionalidades, sin importar cuán 'geniales' parezcan a última hora.

Los esfuerzos son 100% documentación, limpieza profunda y ensayo de la presentación del producto funcional.

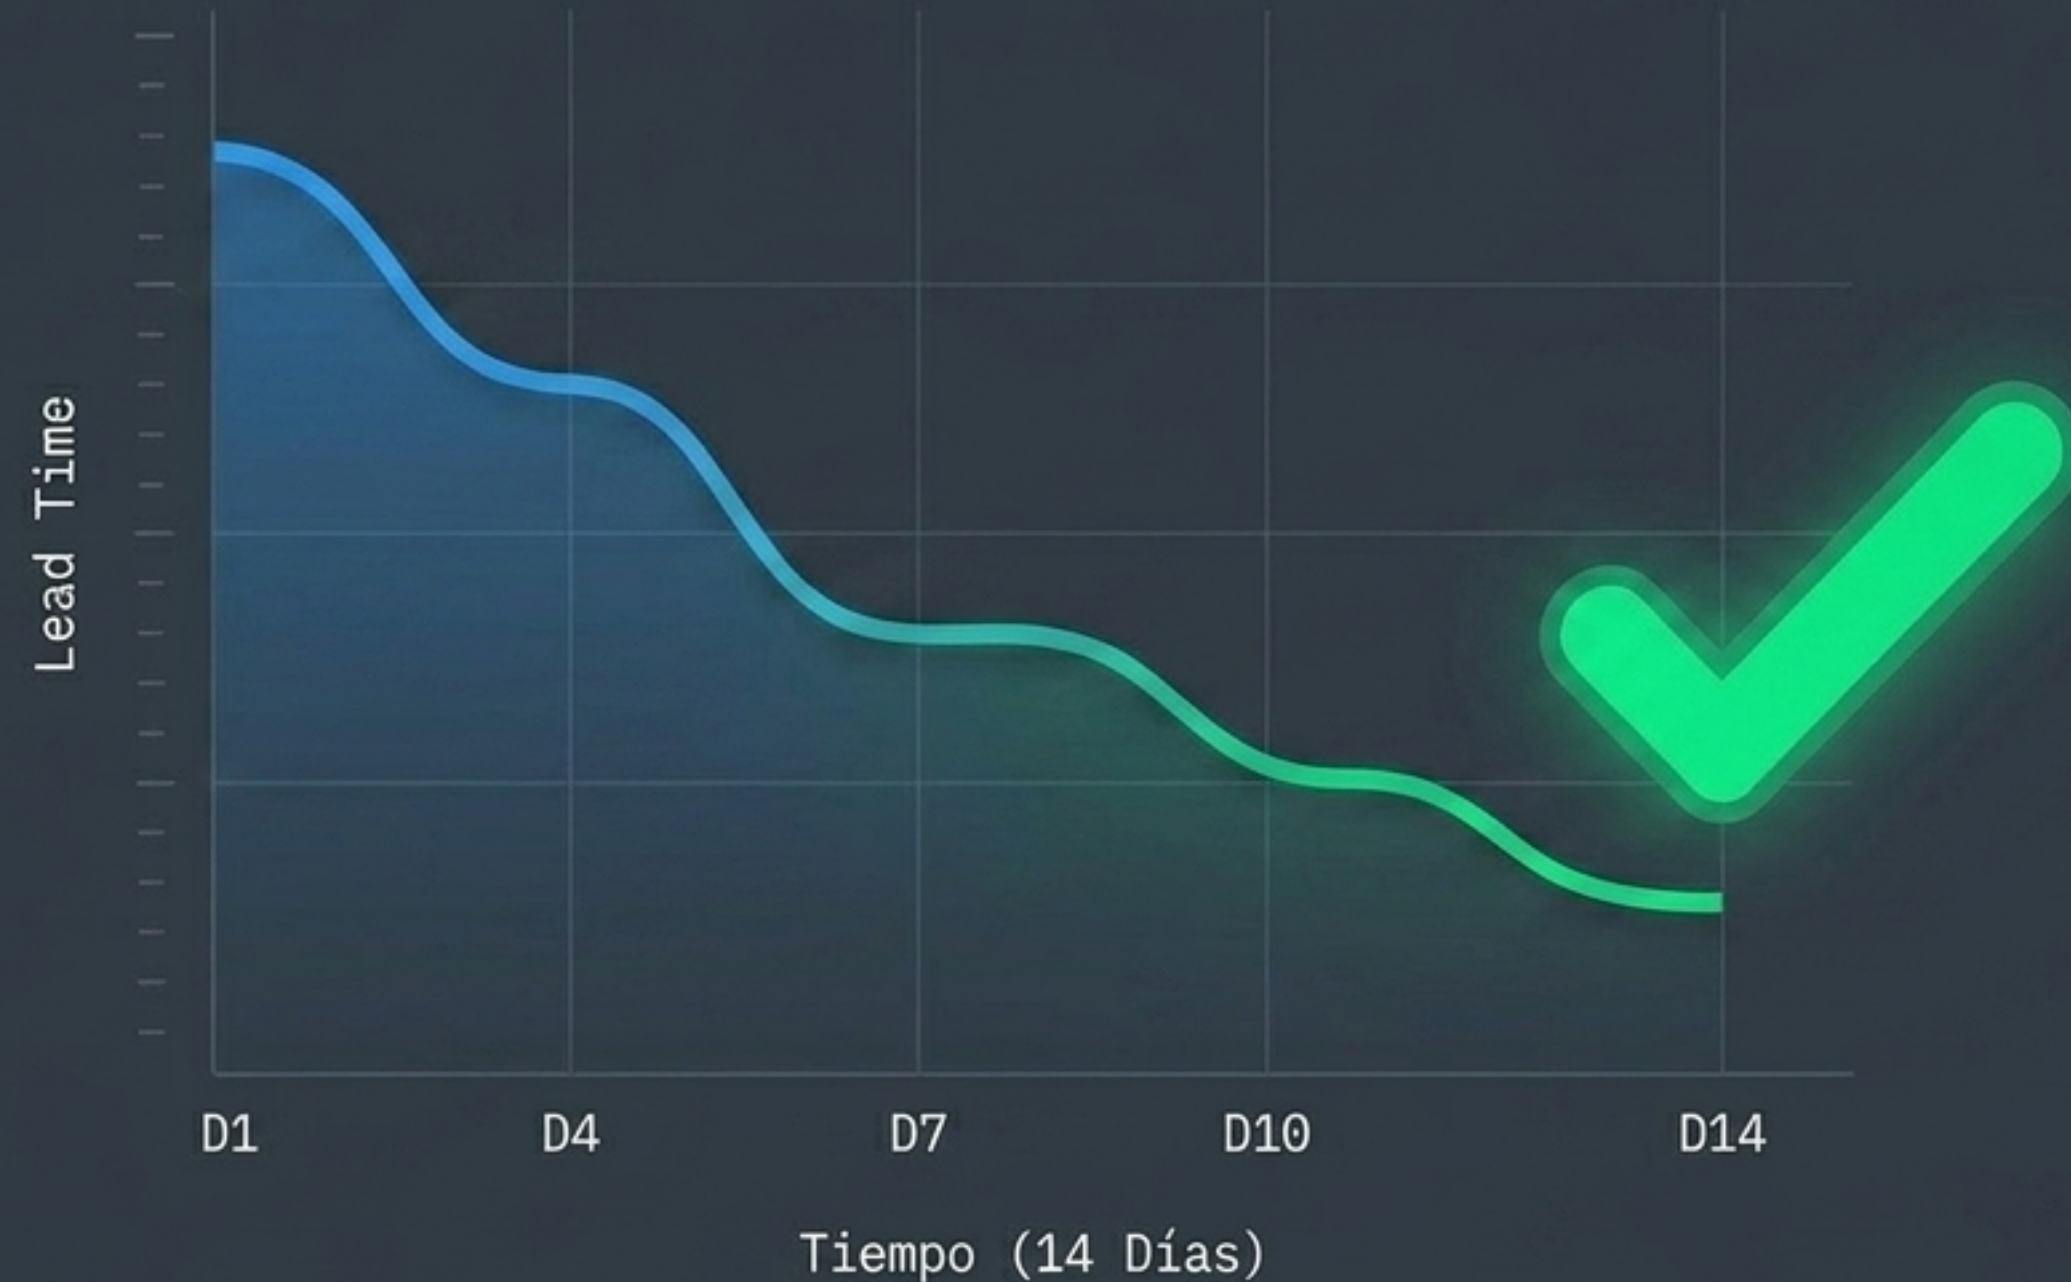

La Métrica Definitiva

En Kanban, el éxito no es cuántas horas agónicas pasaste frente al teclado el último día. El éxito es el tiempo mínimo que tardó una pieza de valor en viajar de 'TO DO' a 'DONE' con máxima calidad.

Un sistema de trabajo organizó siempre vence al caos de la noche anterior.
